

4月7日水

4月7日着工し、工事解体が完了した。
ご主人様には一日、お礼の思いを込めて申し分
ありませんでした。
一番気にしていた自アリの被害に7月31日までは
思いつく程ひどくありませんでした。
洗面所の天井はお取側の4報告がありましたので
交換しました。

お取側の敷居下の土台には自アリがいました。
今、外に置いておくと他の極動脈は別の人
ので自アリ工事の時に殺虫してはいます。

屋根うららの自アリ被害はひどくありません。

本日は洗面所床が張れぬ状態。洗剤機が
使用できません。お取さん。

台所のお湯は使用できます。洗面所
のボイラーで操作してF20。

水漏れについては、同じ様でした。下の給湯器は
撤去してのぞいてみます。

ボイラーは機械で交換

山本

御苦勞様です。

自蟻の被害が思っていたより少ない様で
安心しました。5月のGWに息子と羽根蟻が
洗面所・浴室に飛び出していたので
心配していましたが、飛び出す前に処理が
できそうなので助かります。

工事期間中、洗濯は出来ないかと思いましたが
床が張れば洗濯機の設置、及び洗濯が
可能でしょうか？

古い給湯機からは確かに水漏れしていたので、お
取さん“漏水”の対象にはなりませんか？

日中はほとんど誰もいないので、お取さんの方で
イタホンが壊れる問題は無いのですが、
機械の交換が必要であれば提案をお願いします。

明日も宜しくお願ひします


山中

4月8日木

2日目完了です。 洗剤はお母さんかあけておいたと聞くとこの2日、洗剤は使われていないので

洗剤機は使えるようにしているとのこと。 使ったこと。

質問ですが、洗剤の排水はここ（排水口）を使用して

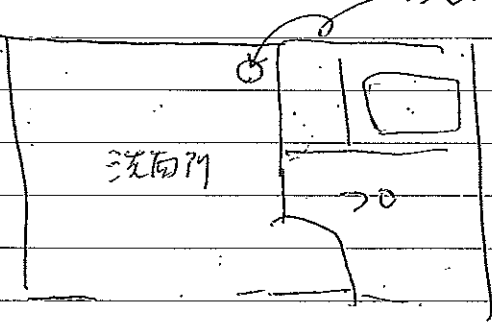

うまか？ 試運転時に排水が正常に流れてきた。 明日は水道屋さんが来るので、それをお待ち。

いっしょには一度ご提案します。

おかげさまでご報告。

息子さんが夕方掃除をしていて2Fから降りてきたので、工事中の音が聞こえたとのことです。

明日は、院医と水道工事です。

(署名)

御苦労様です。

洗濯機の排水は図の通り、脱衣場右側の排水口を使用していました。

7日(水)の朝まで使用していましたが、何の問題もなかったのですが

9日(金)に確認をお願いします。

4#9日(金)

洗剤機の排水について。

排水配管は交換したのですが、内蔵がくさ使用


したためです。ご心配をお掛けしました。

防蟻工事について。

お70周辺以外には自アリは付いていませんでした。

1日調査していただいたため、今日着いたところから

1丈ありです。下図を参照してください。

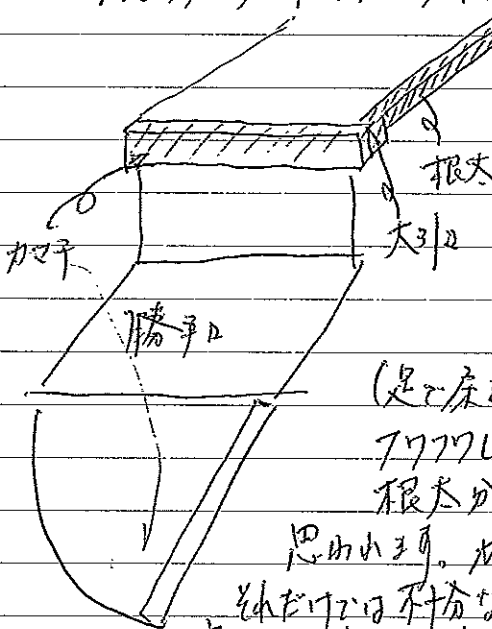

自アリの侵入は床下に付いた
ところ(荷物をかけた)

勝手口の部分が蟻害の
スズメバチの状態に付いた。

又、洗剤料土の付着状態

(足で床を踏みつけたところ)をみると、床が
フワフワしてあります。お70に一番近い
根太が蟻害にあり、弱く付いていると

思われます。勝手口への交換も可能ですが

排水口への不具合工事と思われ、その際でしたら
部分的に床材を撤去して下地から交換し、部分的に

不具合箇所を撤去すると思われ。しかし、半日強の作業に
かかるため、ご迷惑をお掛けする可能性があります。ご了承下さい。

御苦労様です。

左頁の白蟻被害について。

ご提案の通り、施工をお願い致します。

半日強の工期の延長と費用発生は
止むを得ないと考えます。

但しこれ以上の被害がない事を

祈っています。

御苦勞様です

12日夜、食器洗浄機を使用のため
台所内にある給湯器リモコンの
スイッチを入れたところ、反応がありません
電源が切れている様子。

工事都合で電源を切っているのではありませんか？



すみません。何かアンケートが
取付けられました。

4/13 (火)

本日夜に使用の説明に来たかと昨日。
申し上げたところ、本日夜に予定が入ったので
遅くなりました。すみません。

説明書等は全てご説明の上におこなったので
基本的な使用法については、パウチを折り紙にした
状態で方便下さい。

又、洗面化粧台の上の棚板については
寸法が違っており左のためにもう一度カットして

と申し、洗面所入口の片が少し異なる様子で
全明に調整して。

